




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/243

Дана: 29.11.2024. год.

28

БИЛТЕН бр. 243
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
29.11.2024. године

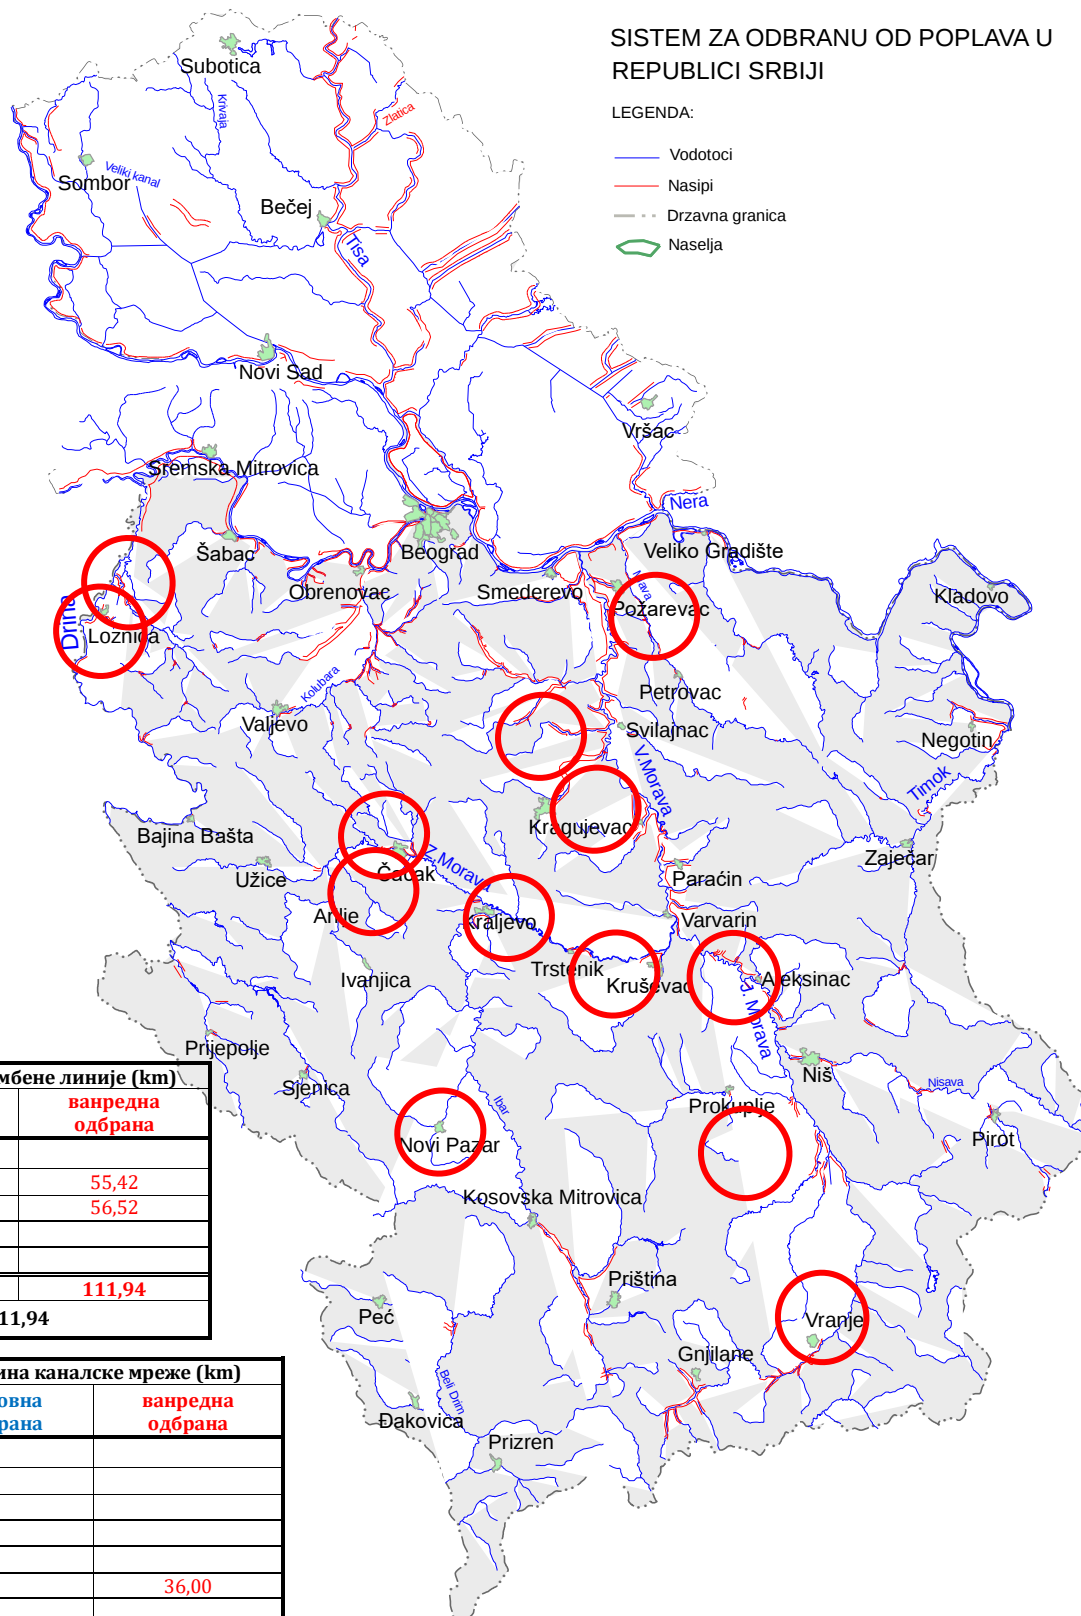

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		55,42
Морава		56,52
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		111,94
УКУПНО:	111,94	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Дрина, Штира	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.1. - објекти 1 – 4.	Лозница	ванредна одбрана	21,30
Јадар, ушће у Дрину	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.2. - објекти 1. и 2.	Лозница	ванредна одбрана	18,78
Млава, Витовница	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.1-објекат 6 Д.22.2-објекат 4	Мало Црниће, Пожаревац	ванредна одбрана	9,44
				Укупно ВП Сава:	55,42
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Лепеница	„Лепеница - Крагујевац“	М.3./М.3.3. – објекат 1.	Крагујевац	ванредна одбрана	8,20
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„Велика Морава – Ђуприја, Параћин“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“,	М.10. – М.10.7. брана Брестовац	Бојник	ванредна одбрана	-
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање“	М.11./М.11.3. - објекат 1.	Врање	ванредна одбрана	2,70
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	56,52
				Укупно:	111,94

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 29.11.2024.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-179	-2	-177	83
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-80	1	-79	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	16	0	16	92
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-338	2	-334	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	56	1	-	0.554
6	Смед. Паланка	Кубршница	75	2	-	-
7	Мајур	Лугомир	32	2	-	0.444
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-177	0	-	2.78
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	26	-1	-	9.92
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-167	2	-	36.2
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-119	10	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	35	-1	-	30.4
13	Власотинце	Власина	20	0	-	2.85
14	Лесковац	Ветерница	44	3	-	3.31
15	Печењевце	Јабланица	35	8	-	1.36
16	Пепељевац	Топлица	32	28	-	4.62
17	Дољевац	Топлица	-7	1	-	5.47
18	Пирот	Нишава	-70	-10	-	7.01
19	Ниш	Нишава	59	7	-	8.62
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	220	7	-	15.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-118	-2	-	-
23	Рашка	Ибар	186	-1	-	26.5
24	Лоп. лакат	Ибар	47	-1	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	446	4	-	4000
1	Јамена	САВА	543	2	543	1359
2	Ср.Митровица	САВА	299	12	294	1645
3	Шабац	САВА	166	9	-	-
4	Београд	САВА	235	6	237	-
5	Радаљ	ДРИНА	31	4	193	50.9
6	Пријеполје	ЛИМ	69	-4	-	65.1
7	Лешница	Јадар	-10	1	-	1.16
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	6	-	0.429
9	Словац	КОЛУБАРА	112	13	-	48.9
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	9	12	-	3.26
11	Дражевац	КОЛУБАРА	62	6	-	-
12	Боговађа	Љиг	69	6	-	.171
13	Коцељева	Тамнава	25	7	-	1.04
14	Ћеманов мост	Тамнава	45	1	-	0.879
15	Бездан	ДУНАВ	43	-6	44	1545
16	Богојево	ДУНАВ	100	-3	100	1950
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	120	-3	121	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	111	-1	111	-
19	Земун	ДУНАВ	279	6	281	-
20	Панчево	ДУНАВ	302	6	305	-
21	Смедерево	ДУНАВ	446	4	-	4000
22	В.Градиште	ДУНАВ	751	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	140	-1	-	-
24	Сента	ТИСА	231	-3	233	312
25	Тител	ТИСА	180	2	179	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	16	0	16	92
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-338	2	-334	-
28	Велико Село	Млава	43	1	-	2.62
29	Књажевац	Б.Тимок	39	0	-	4.41
30	Зајечар	Б.Тимок	-86	2	-	2.6
31	Чокоњар	Тимок	59	-1	-	2.38

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Великог Градишта и Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Варварина где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Мојсиња и Грделице где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.22.:

Деонице Д.22.1. (објекат 6) и Д.22.2. (објекат 4)

На основу наредбе главног руководиоца за одбрану од поплава (заводни број Д-18/230-3 од 12.11.2024.) о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава, дана 20.11.2024. године, започети су интервентни радови на ушћу реке Витовнице у Млаву, стационажа km 35+900 по току реке Млаве, km 24+700 по десном насипу реке Млаве. Радови се изводе у складу са Елаборатом хитних интервентних радова и подразумевају обезбеђење протицајног профила реке Млаве у зони ушћа водотока Витовнице у Млаву, односно уклањање наплавина, дрвне масе и другог речног, вученог и плутајућег наноса у кориту водотока а што је и узроковало стварање спруда („чепа“) који је у потпуности затворио протицајни профил Млаве, као и узроковао урушавање обала у зони улива водотока Витовнице у Млаву. Све то је утицало на поремећај режима тока реке, стварање успора и пораста водостаја на узводним деоницама и претило изливањем и плављењем брањеног подручја. Радови обухватају уклањање спруда, наплавина као и уклањање дрвне масе, стабала и растиња у зони извођења радова. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“ доо, Пожаревац су у константном контакту и спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Мере одбране од поплава остају на снази док се водни објекти не доведу у функционално стање.

Сектор С.6.:

Деонице С.6.1. (објекти од 1 до 4) и С.6.2. (објекти 1 и 2)

У току је ванредна одбрана од поплава на датим деоницама, због оштећења заштитног водног објекта - насипа на техничкој деоници С.6.1. уз реку Дрину, на локацији - обилазни пут око Лознице, где је најекстремније оштећење у виду потпуног уклањања/засацања брањене косине у дужини од око 150 m, заштитни водни објекти – обострани насипи око реке Штире у зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, као и обострани насипи на реци Јадар који су оштећени у зонама изградње мостова.

У циљу отклањања наведених оштећења и довођења заштитног система у функционално стање, након више одржаних састанака са представницима извођача радова на изградњи брзе саобраћајнице Шабац-Лозница предузете су мере извршени земљани радови на санацији „затворању“ обостраних насипа на реци Јадар у зони моста у Јелаву као и извршено чишћење корите реке Јадар у тој зони. Такође, у току су радови на изградњи АБ зида на делу деснообалног Дринског насипа (обилазни пут око Лознице). Изградња наведеног зида у дужини од око 140m подразумева и уградњу „дренаже“ као и неопходне земљане радове. Радови на овом локалитету су у завршној фази. На водотоку Штира у зони новоизграђеног моста, извршено је чишћење корита од земљаног материјала и шута које је спречавало „нормалан“ режим тока реке Штире у зони моста, док су у току радови на облагању минор корита реке Штире уградњом ломљеног камена и уклањање привремене „девијације“ изграђене као привремена саобраћајница од АБ цеви. Очекивани рок за завршетак радова на санацији наведених оштећења је 05.12.2024. године.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава што подразумева и константан контакт са представницима извођача радова на брзој саобраћајници Шабац-Лозница у циљу предузимања евентуалних мера у случају наилаaska поплавног таласа. Мере одбране од поплава остају на снази док се водни објекти не доведу у функционално стање.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Деоница С.7.5.- Обалоутврда на десној обали Лима у Пријеполу:

Дана 27.11.2024. године након одржане планиране вежбе и формирање одбрамбене линије применом мобилне опреме на сектору/техничкој деоници С.7.5. на делу објекта 1.- Обалоутврде на десној обали Лима у Пријеполу, стекли су се услови за укидање мера одбране од поплава. Наредбом број С.7.5. – Вежба бр.2. (заводног броја 22/72 од 27.11.2024.) укинута је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим–

Пријепоље“, сектор С.7, деоница С.7.5. дана 27.11.2024. године са почетком у 7⁰⁰ часова код „Хидротан“ доо Београд.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „MARKO TRANS CARGO“ доо БЕОГРАД спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Лепеница – Крагујевац“, на сектору М.3., деоница М.3.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На реци Лепеници се изводе хитни радови на санацији оштећене водоводне цеви. Квар није лоциран. Радови су обустављени док се не добије потребна документација за измештања цевовода.

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЋУПРИЈА“ доо Ћуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ћуприја, Параћин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.7. брана Брестовац.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ из Бојника спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.10., деоница М.10.7., брана Брестовац., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

28.11. ÷ 29.11.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.10.7.1, по Наредби бр.Д-18/230-2 од 12.11.2024.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

28.11. ÷ 29.11.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.11.3.1, левообални насип уз реку Јужну Мораву од железничке станице Врање до ушћа Врањске (Градске) реке по Наредби бр.Д-18/230-1 од 12.11.2024.године.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2.: брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ћелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 29.11.2024.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.56	250.55	-1 ▼	252.50	-195 ▼	258.50	-795 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница					0.035				312.38		312.38		313.50
4	Гружа					0.200				269.20		270.00		271.30
5	Бресница					0.025	650.82	650.82		659.00	-818 ▼	660.50	-968 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.10	263.10		263.15	-5 ▼	263.15	-5 ▼	265.50
7	Придворица					0.010	530.00	530.00		539.50	-950 ▼	541.50	-1150 ▼	543.00
8	Барје			0.34	0.34	0.3-0.4	363.95	363.95		370.50	-655 ▼	379.00	-1505 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	328.54	328.60	+6 ▲	332.00	-340 ▼	337.50	-890 ▼	339.00
10	Крајковац	0.01	0.01	0.03	0.03	0.010	430.84	430.83	-1 ▼	438.00	-717 ▼	440.00	-917 ▼	441.00
11	Телије	1.50	3.00	1.00	1.00	0.600	273.06	273.13	+7 ▲	277.00	-387 ▼	282.00	-887 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.01	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.19	131.20	+1 ▲	132.00	-80 ▼	133.40	-220 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	142.05	142.05		142.10	-5 ▼	142.10	-5 ▼	145.60
14	Дивљана	0.34	0.34	0.34	0.34	0.150	335.54	335.54		335.50	+4 ▲	335.50	+4 ▲	337.50
15	Завој	0.60		5.30		0.450	602.09	602.09		615.00	-1291 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	7.00	7.00	7.00	7.00		273.25	273.28	+3 ▲	273.25	+3 ▲			
21	Овчар бања	7.00	7.00	7.00	7.00	3.750	292.31	292.22	-9 ▼	292.50	-28 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		537.70	537.70		538.40	-70 ▼	538.40	-70 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутни			0.80	0.80	0.300	618.65	618.67	+2 ▲	621.30	-263 ▼	627.00	-833 ▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392
