




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/244

Дана: 02.12.2024. год.

28

БИЛТЕН бр. 244
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
30.11.-02.12.2024. године

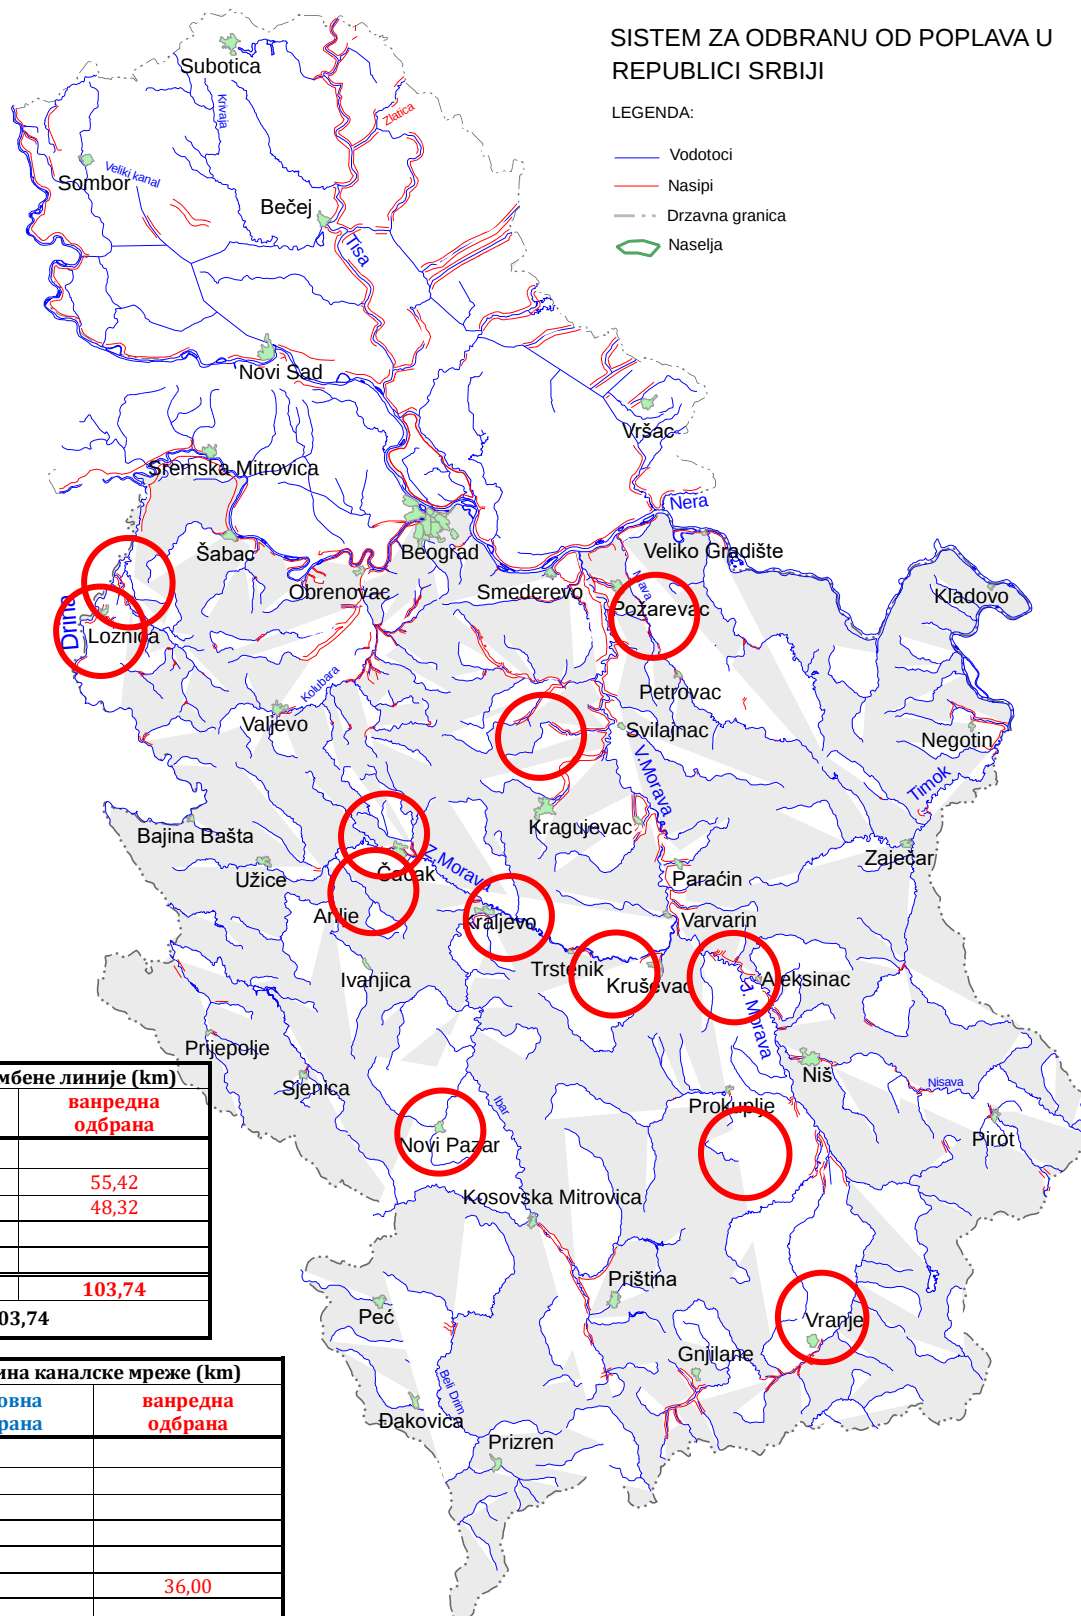

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		55,42
Морава		48,32
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		103,74
УКУПНО:	103,74	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Дрина, Штира	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.1. - објекти 1 – 4.	Лозница	ванредна одбрана	21,30
Јадар, ушће у Дрину	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.2. - објекти 1. и 2.	Лозница	ванредна одбрана	18,78
Млава, Витовница	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22.1-објекат 6 Д.22.2-објекат 4	Мало Црниће, Пожаревац	ванредна одбрана	9,44
				Укупно ВП Сава:	55,42
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Кочански поток	„Велика Морава – Ћуприја, Параћин“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“,	М.10. – М.10.7. брана Брестовац.	Бојник	ванредна одбрана	-
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање“	М.11./М.11.3. - објекат 1.	Врање	ванредна одбрана	2,70
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	48,32
				Укупно:	103,74

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Наредбом број М.3-1** (заводног броја 22/74 од 02.12.2024.) УКИДА СЕ ВАНРЕДНА одбрана од поплава на Водној јединици „ЛЕПЕНИЦА-КРАГУЈЕВАЦ“, на сектору М.3. деонице М.3.3. заштитни објекат 1, дана 02.12.2024. године са почетком у 11⁰⁰ часова код „Marko Trans Cargo“ доо, Београд.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 02.12.2024.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-131	16	-139	162
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-39	25	-52	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	54	21	45	152
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-322	12	-323	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	69	8	-	1.25
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	43	-1	-	1.29
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-142	31	-	9.79
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	46	18	-	18.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-104	15	-	91.5
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-97	23	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	67	26	-	56.1
13	Власотинце	Власина	-	-	-	-
14	Лесковац	Ветерница	53	-10	-	4.65
15	Печењевце	Јабланица	60	-2	-	4.75
16	Пепељевац	Топлица	44	16	-	8.1
17	Дољевац	Топлица	53	34	-	20.6
18	Пирот	Нишава	-70	0	-	7.01
19	Ниш	Нишава	56	3	-	7.48
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	266	18	-	33.2
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-63	39	-	-
23	Рашка	Ибар	246	50	-	69.5
24	Лоп. локат	Ибар	86	27	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	452	-1	-	4150
1	Јамена	САВА	636	13	634	1684
2	Ср.Митровица	САВА	355	8	354	1980
3	Шабац	САВА	216	9	-	-
4	Београд	САВА	247	7	248	-
5	Радаљ	ДРИНА	27	-55	88	48.5
6	Пријеполје	ЛИМ	70	-2	-	66.2
7	Лешница	Јадар	30	12	-	5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	18	-3	-	0.886
9	Словац	КОЛУБАРА	145	-8	-	64.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	42	2	-	12.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	127	20	-	-
12	Боговађа	Љиг	105	-1	-	1.51
13	Коцељева	Тамнава	39	7	-	1.75
14	Ћеманов мост	Тамнава	65	12	-	1.81
15	Бездан	ДУНАВ	55	12	48	1605
16	Богојево	ДУНАВ	102	9	98	1962
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	117	6	113	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	106	5	103	-
19	Земун	ДУНАВ	290	8	292	-
20	Панчево	ДУНАВ	311	5	315	-
21	Смедерево	ДУНАВ	452	-1	-	4150
22	В.Градиште	ДУНАВ	752	-4	-	-
23	Прахово	Дунав	162	8	-	-
24	Сента	ТИСА	231	3	230	312
25	Тител	ТИСА	179	8	177	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	54	21	45	152
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-322	12	-323	-
28	Велико Село	Млава	56	6	-	4.24
29	Књажевац	Б.Тимок	42	0	-	5.17
30	Зајечар	Б.Тимок	-81	3	-	3.06
31	Чокоњар	Тимок	83	24	-	3.47

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Великог Градишта и Смедерева где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.22.:

Деонице Д.22.1. (објекат 6) и Д.22.2. (објекат 4)

На основу наредбе главног руководиоца за одбрану од поплава (заводни број Д-18/230-3 од 12.11.2024.) о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава, дана 20.11.2024.године, започети су интервентни радови на ушћу реке Витовнице у Млаву, стационажа km 35+900 по току реке Млаве, km 24+700 по десном насипу реке Млаве. Радови се изводе у складу са Елаборатом хитних интервентних радова и подразумевају обезбеђење протицајног профила реке Млаве у зони ушћа водотока Витовнице у Млаву, односно уклањање наплавина, дрвне масе и другог речног, вученог и плутајућег наноса у кориту водотока а што је и узроковало стварање спруда („чепа“) који је у потпуности затворио протицајни профил Млаве, као и узроковао урушавање обала у зони улива водотока Витовнице у Млаву. Све то је утицало на поремећај режима тока реке, стварање успора и пораста водостаја на узводним деоницама и претило изливањем и плавлеењем брањеног подручја. Радови обухватају уклањање спруда, наплавина као и уклањање дрвне масе, стабала и растиња у зони извођења радова. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“ доо, Пожаревац су у константном контакту и спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Мере одбране од поплава остају на снази док се водни објекти не доведу у функционално стање.

Сектор С.6.:

Деонице С.6.1. (објекти од 1 до 4) и С.6.2. (објекти 1 и 2)

У току је ванредна одбрана од поплава на датим деоницама, због оштећења заштитног водног објекта - насипа на техничкој деоници С.6.1. уз реку Дрину, на локацији - обилазни пут око Лознице, где је најекстремније оштећење у виду потпуног уклањања/засацања брањене косине у дужини од око 150 m, заштитни водни објекти - обострани насипи око реке Штире у зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, као и обострани насипи на реци Јадар који су оштећени у зонама изградње мостова.

У циљу отклањања наведених оштећења и довођења заштитног система у функционално стање, након више одржаних састанака са представницима извођача радова на изградњи брзе саобраћајнице Шабац-Лозница предузете су мере извршени земљани радови на санацији „затварању“ обостраних насипа на реци Јадар у зони моста у Јелаву као и извршено чишћење корите реке Јадар у тој зони. Такође, у току су радови на изградњи АБ зида на делу деснообалног Дринског насипа (обилазни пут око Лознице). Изградња наведеног зида у дужини од око 140m подразумева и уградњу „дренаже“ као и неопходне земљане радове. Радови на овом локалитету су у завршној фази. На водотоку Штира у зони новоизграђеног моста, извршено је чишћење корита од земљаног материјала и шута које је спречавало „нормалан“ режим тока реке Штире у зони моста, док су у току радови на облагању минор корита реке Штире уградњом ломљеног камена и уклањање привремене „девијације“ изграђене као привремена саобраћајница од АБ цеви. Очекивани рок за завршетак радова на санацији наведених оштећења је 05.12.2024. године.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава што подразумева и константан контакт са представницима извођача радова на брзој саобраћајници Шабац-Лозница у циљу предузимања евентуалних мера у случају наиласка поплавног таласа. Мере одбране од поплава остају на снази док се водни објекти не доведу у функционално стање.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Деоница С.7.5.- Обалоутврда на десној обали Лима у Пријеполу:

Дана 27.11.2024. године након одржане планиране вежбе и формиране одбрамбене линије применом мобилне опреме на сектору/техничкој деоници С.7.5. на делу објекта 1.- Обалоутврде на десној обали Лима у Пријеполу, стекли су се услови за укидање мера одбране од поплава. Наредбом број С.7.5. – Вежба бр.2. (заводног броја 22/72 од 27.11.2024.) укинута је ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим–

Пријеполје“, сектор С.7, деоница С.7.5. дана 27.11.2024. године са почетком у 7⁰⁰ часова код „Хидротан“ доо Београд.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.2. објекат 7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекат 7., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.7. брана Брестовац.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ из Бојника спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.10., деоница М.10.7., брана Брестовац, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

28.11. ÷ 02.12.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.10.7.1, по Наредби бр.Д-18/230-2 од 12.11.2024.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

28.11. ÷ 02.11.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.11.3.1, левообални насип уз реку Јужну Мораву од железничке станице Врање до ушћа Врањске (Градске) реке по Наредби бр.Д-18/230-1 од 12.11.2024.године.

Сектор М.12.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 02.12.2024.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.55	250.52	-3 ▼	252.50	-198 ▼	258.50	-798 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница					0.035				312.38		312.38		313.50
4	Гружа					0.200				269.20		270.00		271.30
5	Бресница					0.025	650.98	650.98		659.00	-802 ▼	660.50	-952 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.10	263.10		263.15	-5 ▼	263.15	-5 ▼	265.50
7	Придворица					0.010	530.30	530.30		539.50	-920 ▼	541.50	-1120 ▼	543.00
8	Барје			0.64	0.64	0.3-0.4	364.16	364.20	+4 ▲	370.50	-630 ▼	379.00	-1480 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	329.50	329.76	+26 ▲	332.00	-224 ▼	337.50	-774 ▼	339.00
10	Крајковац	0.01	0.01	0.03	0.03	0.010	430.87	430.87		438.00	-713 ▼	440.00	-913 ▼	441.00
11	Ђелије	6.00	9.50	1.00	1.00	0.600	273.53	273.85	+32 ▲	277.00	-315 ▼	282.00	-815 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.19	131.19		132.00	-81 ▼	133.40	-221 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	142.05	142.05		142.10	-5 ▼	142.10	-5 ▼	145.60
14	Дивљана	0.47	0.47	0.47	0.47	0.150	335.55	335.55		335.50	+5 ▲	335.50	+5 ▲	337.50
15	Завој	1.07		0.00		0.450	602.11			615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	24.00	24.00	24.00	24.00		273.28	273.26	-2 ▼	273.25	+1 ▲			
21	Овчар бања	24.00	24.00	24.00	24.00	3.750	292.36	292.40	+4 ▲	292.50	-10 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		537.88	537.88		538.40	-52 ▼	538.40	-52 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.80	0.80	0.300	618.86	618.99	+13 ▲	621.30	-231 ▼	627.00	-801 ▼	627.00

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392
