
„СРБИЈАВОДЕ”Д.О.О, БЕОГРАД
Број: 18/222
Дана: 12.11.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 222
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О
11 - 12.11.2026. године

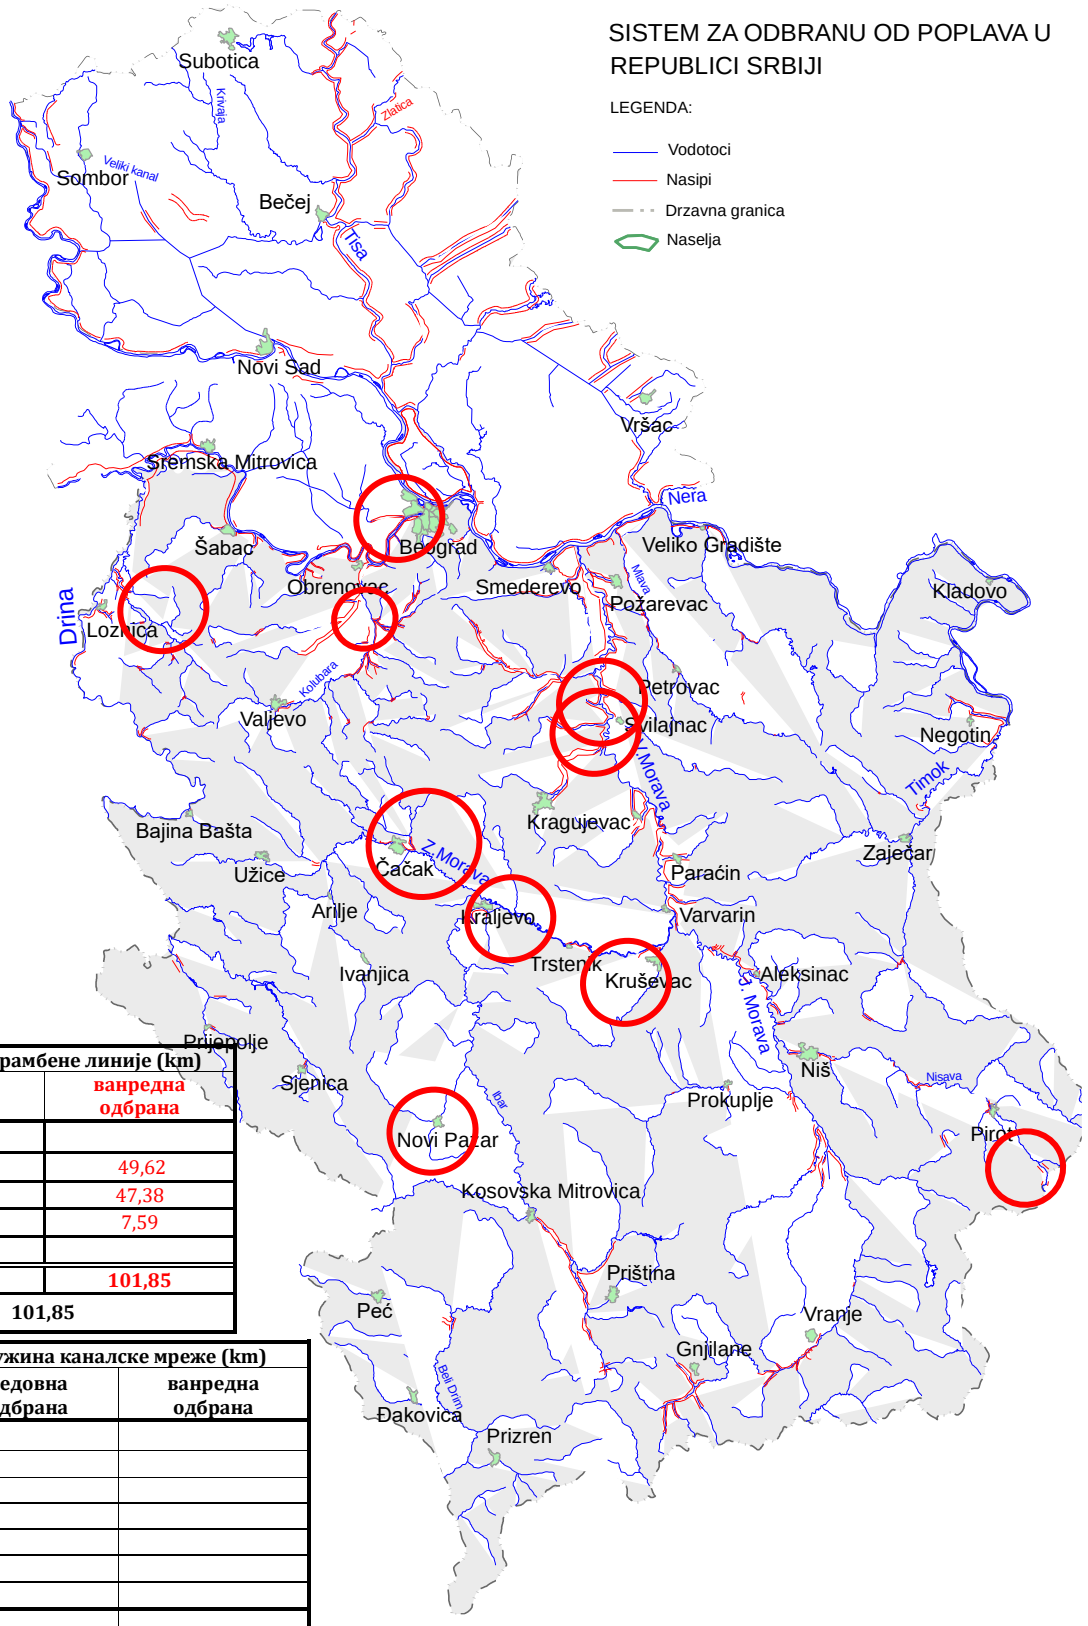

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		49,62
Морава	-	47,38
Ибар и Лепенац	-	7,59
БелиДрим		
Свега:		101,85
УКУПНО:	101,85	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		
Велика Морава		
Свега:		
УКУПНО:		

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	*Водна јединица*	*Сектор/Деоница*	*Угрожена насеља*	*Стање*	*Дужина (km)*
ВП: Сава					
Јадар	''Дрина-Лозница''	С.6./С.6.2.	Брадић	ванредна одбрана	23,55
Сава	„Београд“	С.1.1. (објекат 5) и С.1.2 (објекат 2)	Земун, Нови Београд	ванредна одбрана	18,83
Очаге	„Колубара –Лазаревац”	С.3.10. (објекат 6)	Лазаревац	ванредна одбрана	4,50
				Укупно ВП Сава	**46,88**

Водоток	*Водна јединица*	*Сектор/Деоница*	*Угрожена насеља*	*Стање*	*Дужина (km)*
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велика Морава	„Лепеница – Крагујевац“	М.3.1. – објекат 3.	Свилајнац	ванредна одбрана	0,05
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4.80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ћелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Западна Морава	Западна Морава – Чачак	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	**54,97**
				Укупно:	**104,59**

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 12.11.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-200	4	-200	57
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-102	1	-101	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-17	-2	-20	58
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-376	4	-377	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	48	-1	-	0.219
6	Смед. Паланка	Кубршница	72	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	28	1	-	0.276
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-188	1	-	1.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	13	2	-	5.36
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-198	-1	-	15.5
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-135	-2	-	15.3
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	0	-1	-	12
13	Власотинце	Власина	11	0	-	1.47
14	Лесковац	Ветерница	32	0	-	1.81
15	Печењевце	Јабланица	16	1	-	0.094
16	Пепељевац	Топлица	-6	0	-	0.199
17	Дољевац	Топлица	-19	0	-	3.6
18	Пирот	Нишава	-76	0	-	5.13
19	Ниш	Нишава	53	1	-	6.34
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	211	-1	-	12.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-129	-1	-	40.4
23	Рашка	Ибар	170	0	-	19
24	Лоп. лакат	Ибар	-9	0	-	27.7
25	Смедерево	ДУНАВ	436	1	-	1790
1	Јамена	САВА	234	4	231	417
2	Ср.Митровица	САВА	112	28	98	693
3	Шабац	САВА	-5	23	-	-
4	Београд	САВА	149	0	152	-
5	Радаљ	ДРИНА	87	-56	143	132
6	Пријепоље	ЛИМ	21	2	-	25.6
7	Лешница	Јадар	-	-	-	-
8	Ваљево	КОЛУБАРА	4	0	-	0.076
9	Словац	КОЛУБАРА	89	0	-	39
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-11	-1	-	1.02
11	Дражевац	КОЛУБАРА	55	0	-	-
12	Боговађа	Љиг	45	0	-	.035
13	Коцељева	Тамнава	19	-1	-	0.784
14	Ћеманов мост	Тамнава	39	2	-	0.656
15	Бездан	ДУНАВ	-128	1	-128	880
16	Богојево	ДУНАВ	-76	1	-76	1020
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	-59	1	-59	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	-50	0	-51	-
19	Земун	ДУНАВ	190	-1	193	-
20	Панчево	ДУНАВ	235	2	238	-
21	Смедерево	ДУНАВ	436	1	-	1790
22	В.Градиште	ДУНАВ	742	-2	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-82	5	-	-
24	Сента	ТИСА	237	0	237	120
25	Тител	ТИСА	47	-2	49	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-17	-2	-20	58
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-376	4	-377	-
28	Велико Село	Млава	39	2	-	2.19
29	Књажевац	Б.Тимок	33	2	-	3.16
30	Зајечар	Б.Тимок	-90	0	-	2.2
31	Чокоњар	Тимок	60	17	-	2.4

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у стангацији.

- IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Сава:

Сектор С.1.

Деоница С.1.1. (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2)

На предметним водним објектима на снази су мере ванредне одбране од поплава уведене Наредбом број С.1-1 (број 22/77 од 25.08.2026.год.) на Водној јединици „Београд“, сектору С.1, деоници С.1.1 (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2), дана 25.08.2026. код ВПД „Галовица“д.о.о., Београд – Земун.

Сектор С.3.

Деоница С.3.10. (објекат 6)

Услед извођења нелегалних радова на изградњи приступног пута у водно-заштитном појасу у зони левообалног водног објекта за заштиту од штетног дејства вода (С.3.10.6.)-леви насип уз Очагу од ушћа у Лукавицу, чиме је изазвано оштећење/уклањање дела тела насипа, а самим тим и угрожена његова стабилност и функционалност. Наредбом Број Д.4.Д.5.С.3.- 3. (број 22/79 од 16.09.2026.) на ВЈ „Колубара-Лазаревац”, на сектору С.3. деоница С.3.10. (објекат 6), уведена је ванредна одбрана од поплава. У складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд, извршило је обилазак предметне деонице и сагледавањем стања исте, констатовало да није дошло до нових оштећења.

Сектор С.6.

Деоница С.6.2. објекат 3. (узводна деоница у зони утицаја успора, ван оп.плана насеље Брадић)

Надлежно водопривредно предузеће, „Југокоп-Подриње“ доо Шабац, изводи интервентне радове у зони утицаја успора узводно од моста преко Јадра на путу Горњи Добрић – Козјак, на узводној деоници ван оп.плана, у циљу формирања заштитне линије дужине око 500 метара на десној обали реке Јадар у насељу Брадић, у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/66 од 28.03.2026.године.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.1. објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „Водопривреда“ д.о.о. Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Лепеница - Крагујевац“, на сектору М.3., деоница М.3.1., заштитни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У зони укрштања обилазнице и левообалног насипа Велике Мораве, дошло је до уклањања дела насипа од око 50m за потребе изградње трупа пута. Изводе се радови на сабијању подтла, насипању ломљеног камена и уградњи туцаника у труп пута, као и његово ваљање и сабијање. Очекује се да овакво стање на терену буде и у наредних неколико месеци, за време трајања радова на обилазници.

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница

М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар ”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар ”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:
Деоница М.13.1. објекти 3. и 4. :
Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП :
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ д.о.о. ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја (d=30-80 m, сса 8m3/m1) на нивоу Qsr са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.
